


Revurdering af Letbane-projektets risikoprofil



Tidsplan med faser

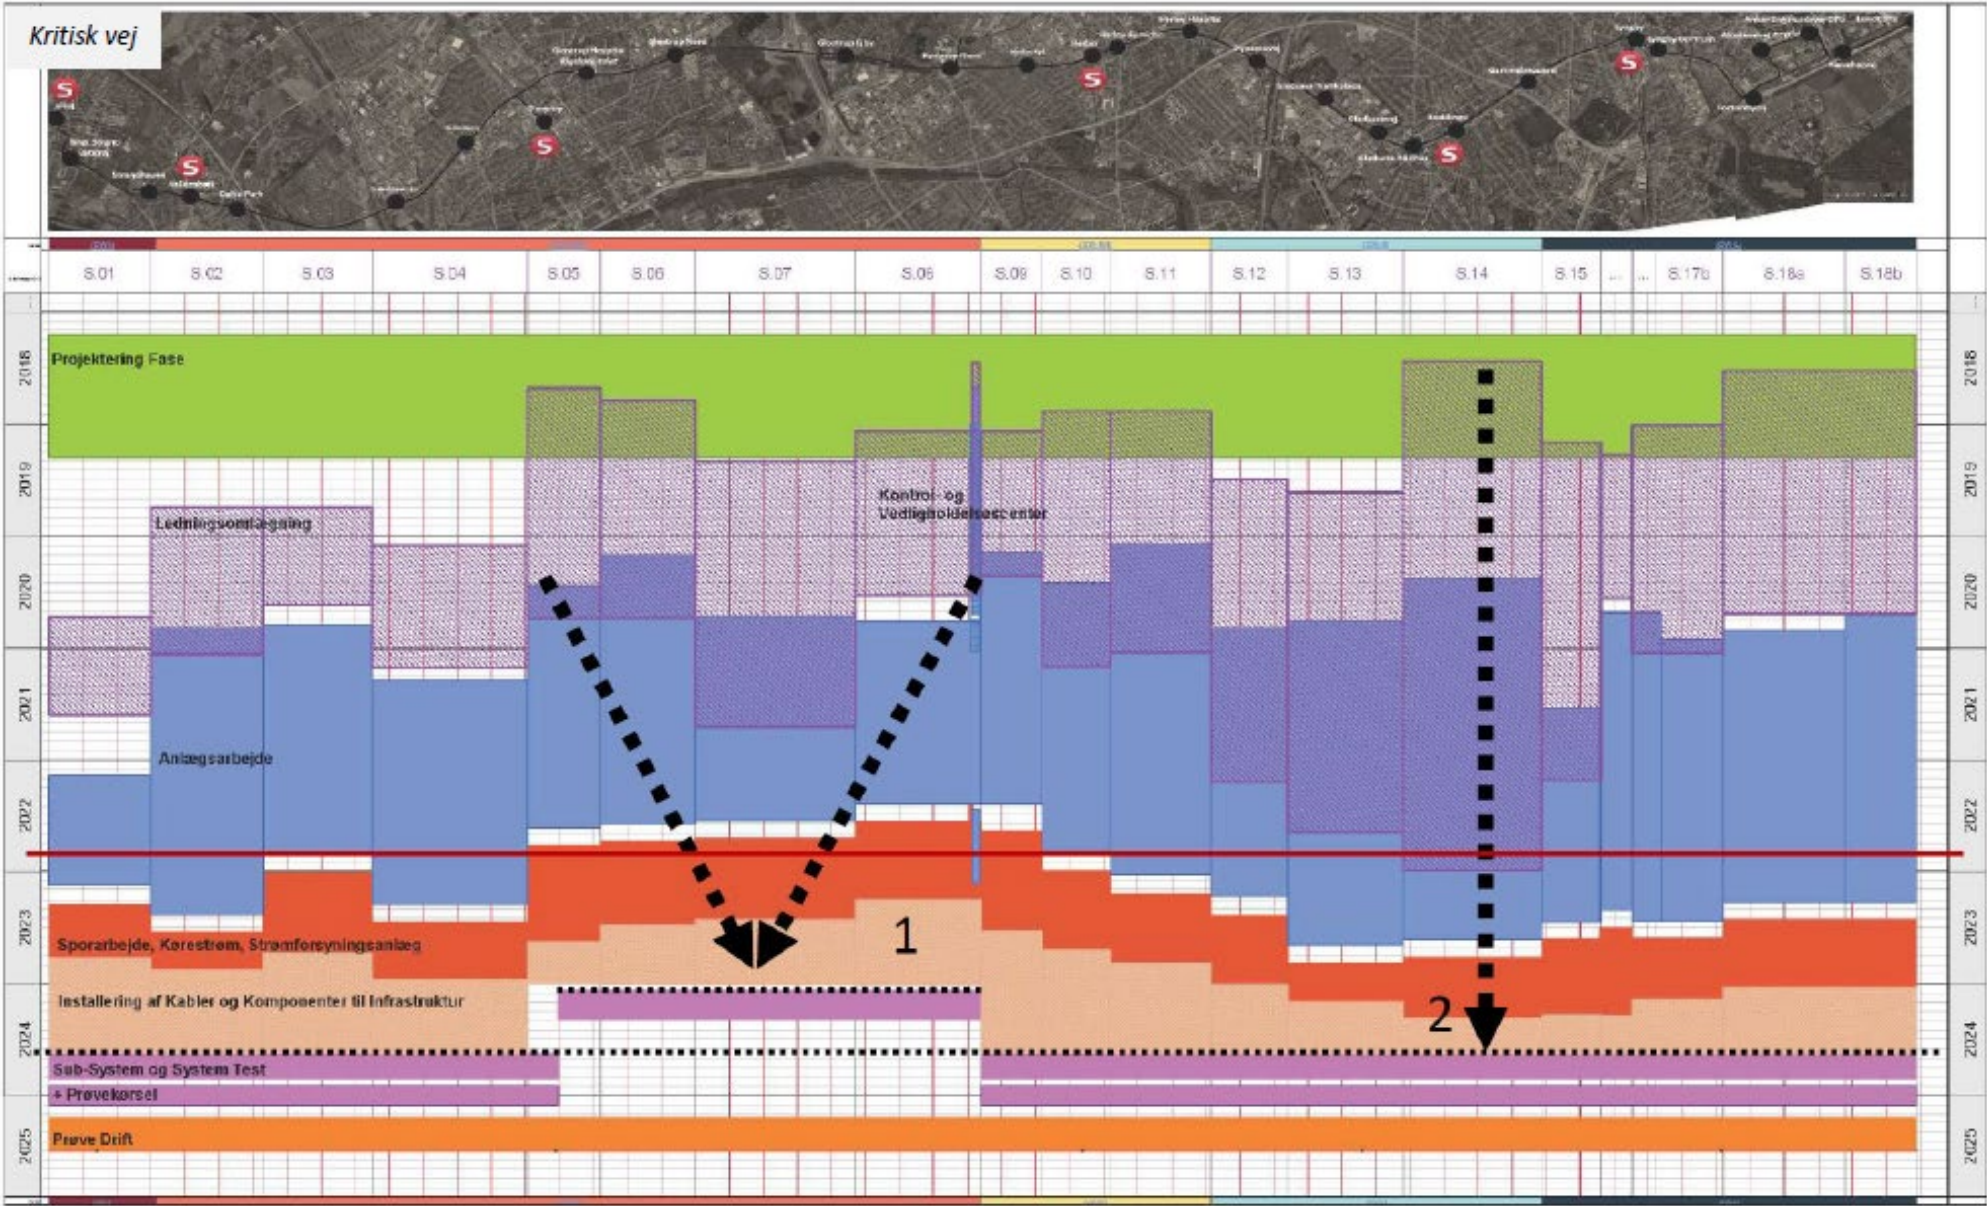

Årsager/input der påvirker genevaluering af risikoprofilen



- Globale og lokale ressourceudfordringer
- Forsinkelser fra ledningsomlægninger og anlægsarbejder slår igennem på næste fase (Transportsystemer), herunder grænsefladeudfordringer
- Komplexitet i myndighedsprocesser
- Stigende jordpriser
- Behov for øget organisatorisk kapacitet i Hovedstadens Letbane som følge af øget kompleksitet i grænseflader




Samlet risikoniveau overstiger projektets reserver



Total Bar Chart

L3 risikoestimat for anlægsprojektet og driftsrelaterede anlægsomkostninger [mio. kr.]

● Samlet - økonomi (anlæg) + kapitaliseret tid (beregnet) ● Samlet - økonomi (driftrelateret anlæg) + kapitaliseret tid (beregnet)

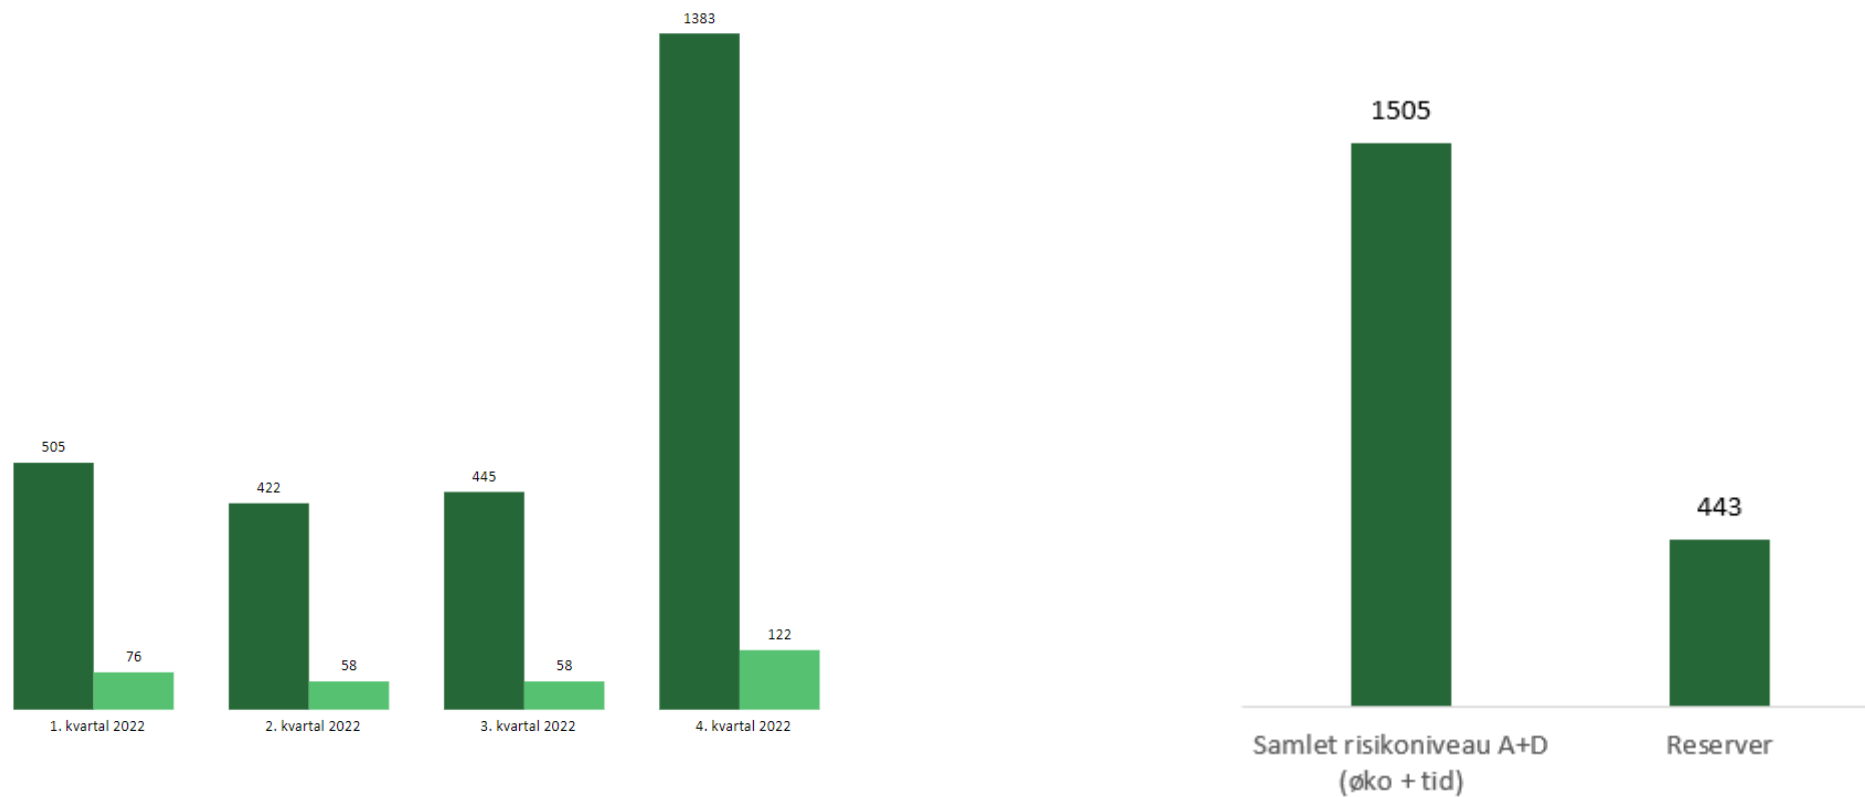

Risiko-mitigerende tiltag

- Afsøge mulighed for at indgå aftaler med entreprenører
- Tæt opfølgning på fremdrift, herunder organisationstilpasning



Videre proces



- Ekstraordinært interessentskabsmøde d. 15/12 mhp. mandat til frigivelse af resterende reserver
- Nyt budgetgrundlag på plads i 2023
- Ejerne forelægges revidere betalingsplaner gældende for 2025 og frem
