



Patientrettigheder & indflytning i Nordfløjen

Overholdelse af kræftpakkerne i 2019 + januar 2020

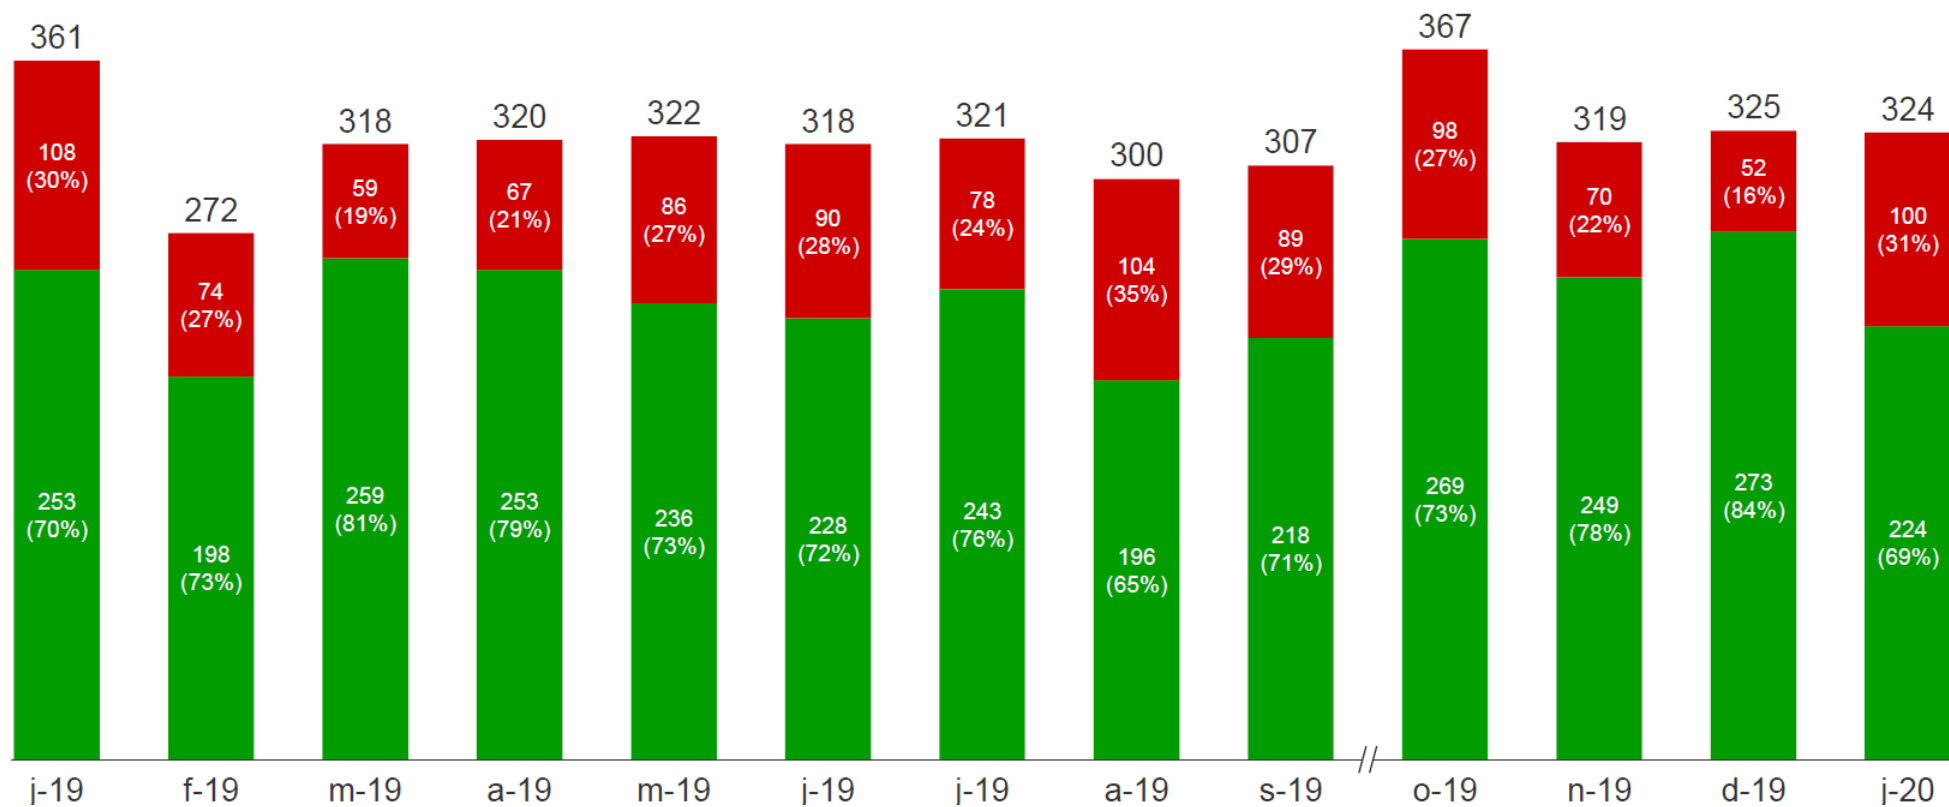

Overholdelse af udredningsretten i 2019 + januar 2020

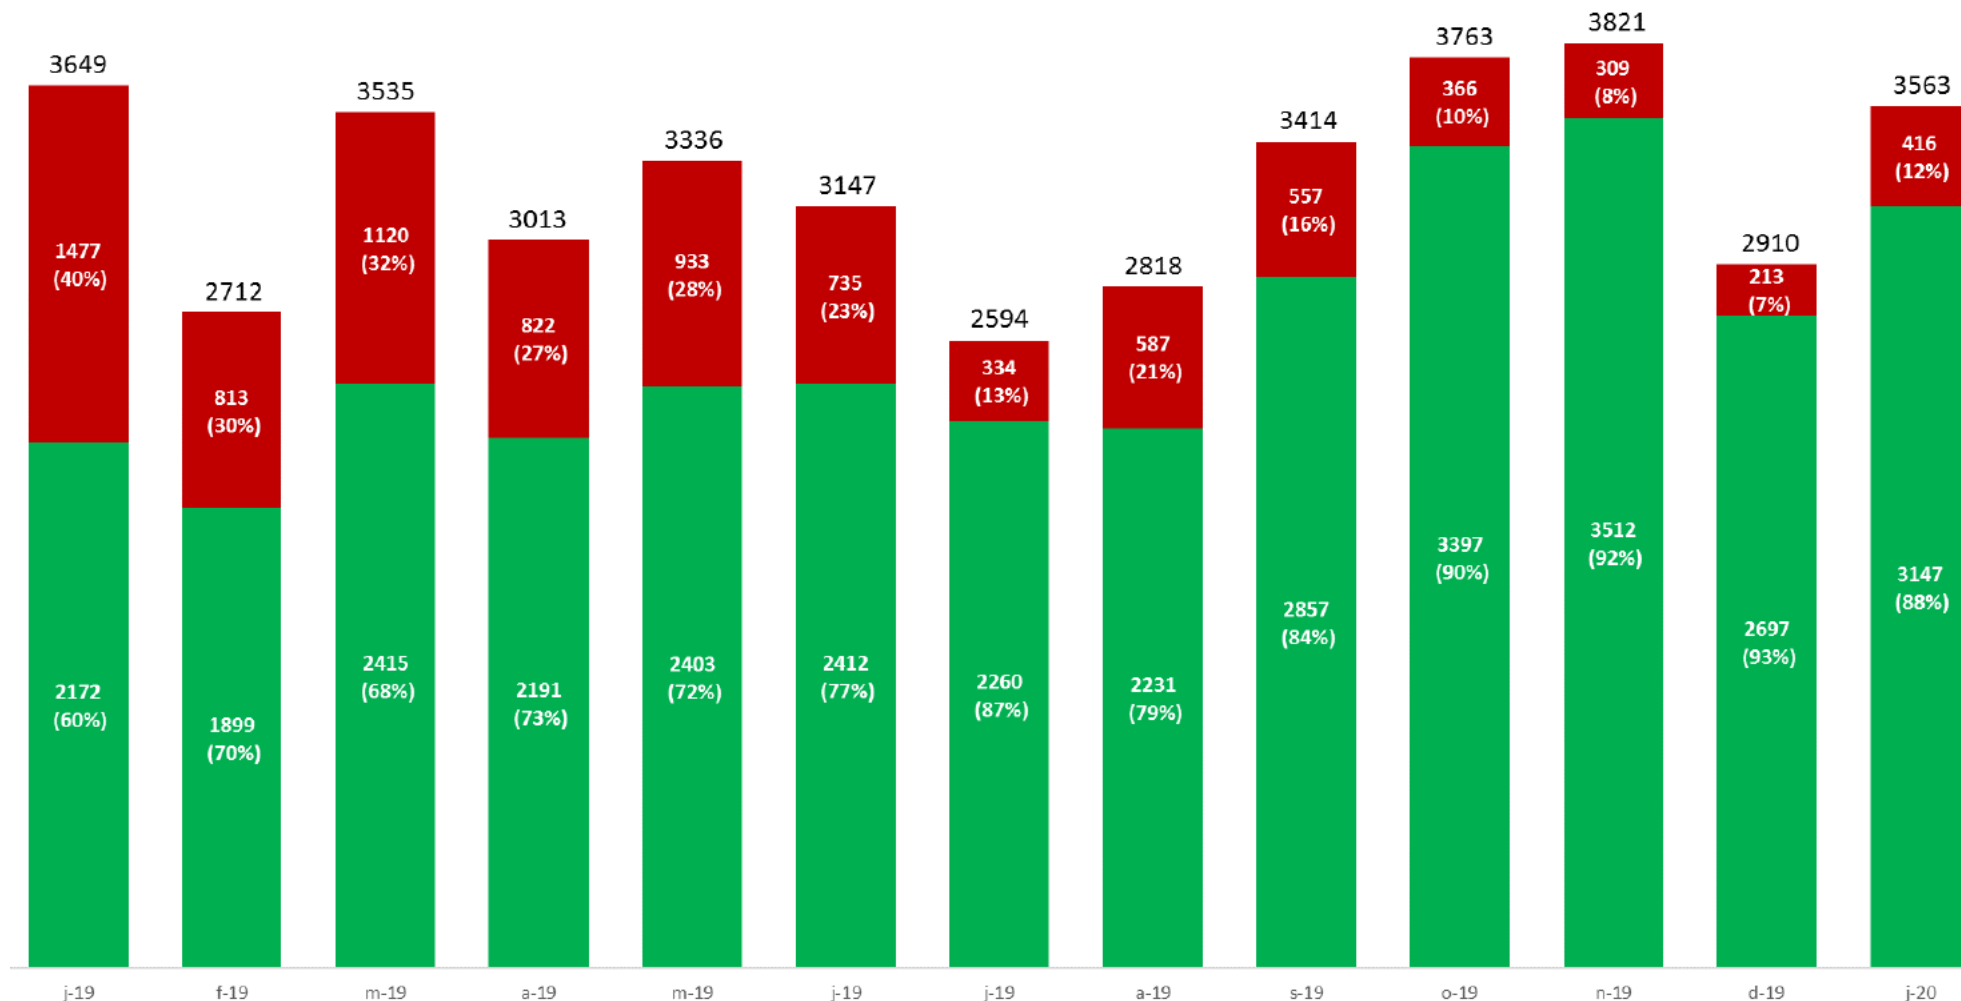

Fokus i 2020 - overholdelse af de regionale mål!

Kræftpakker

- Primo marts indkaldes alle ansvarlige til direktionsmøde mhp. at sikre, at der er den nødvendige aktivitet omkring påske og Kristi himmelfart
- Alle centre laver individuelle strategier og mål for hvert enkelt kræftpakkeforløb, som direktionen godkender
- Alle centre arbejder med udgangspunkt i varslingslisterne

Udredningsret

- Snuden i sporet...

Hvordan påvirker indflytningen i Nordfløjen Rigshospitalets overholdelse af patientrettighederne?

Indflytning i Nordfløjen >< patientrettighederne

Hovedhalskræft, modermærkekræft og kræft i hjerne

- Det er ekstremt komplekst – og tidskrævende - at nedlukke, flytte og genåbne operationsstuer
- Vi kan ikke undgå påvirkning, men overholdelse har højeste prioritet

Brystkræft (HGH)

- Muligheder for at flytte til stueetagen i Centralkomplekset undersøges p.t.

Udredningsret

- Forventes ikke påvirket

Patientsikker flytning til Nordfløjen

Hvorfor ned i aktivitet?

- Frigøre udstyr, der skal flyttes fx 27 operationsstuer
- Minimere antallet af patienter, der fysisk skal flyttes fra 200 – 100

Hvorfor gradvis op i aktivitet?

- Patientsikkerhed
- Anbefaling fra andre store hospitalsflytninger
- Nye rammer og arbejdsgange for alle
- Arbejdsmiljø - fastholdelse af personalet
- Undgå aflysninger / dårlig patientoplevelser og presseomtale

Aktivitet

100 %

50 %

Stop for elektive operationer en uge før 14.juni og første fem op-stuer flyttes

Alle patienter flyttes på én dag



Daglig prioritering og justering på operationsgang:

- Aktivitet (kræft, akut mm)
- Skiftetid
- Knivtid
- Belægning

Flytteperiode to uger

14.juni

De første fire uger i drift i sommerferieperioden
