

Møde i sundhedsudvalget den 5. oktober 2026

Opdateret handleplan på høreområdet
for Nordsjællands Hospital

Centervicedirektør i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Pernille Roland

Stabschef i Rigshospitalets Styringsstøttestab
Marianne Værn Thomsen
Rigshospitalet

Begge matrikler styrer mod 9 uger ultimo Q3 2027

Fælles resultatmål, forskellige udgangspunkter – og en konkretiseret vej mod målet

SUNDHEDSUDVALGET

25.11.2025

14.09.2026

05.10.2026

Handleplan præsenteret

Status og ønske om konkret tidsplan

Opdateret plan med delmål

UDVIKLING FREM TIL NU

Juli 2025

Okt. 2025

Juli 2026

Aktuelt

BBH 42 | HIL 55

BBH 36 | HIL 60

BBH 22 | HIL 50

BBH 20 | HIL 50

Oprindelig handleplan: 18 uger ultimo Q2 2026 → 14 uger ultimo Q4 2026 → 9 uger ultimo Q3 2027

Aktuelt

Q4 2026

Q1 2027

Q2 2027

Q3 2027

Hillerød

Genopretningsspor

50

48*

30*

18*

9

Bispebjerg

Fortsat reduktion

20

17*

14*

11*

9

Målet står fast: 9 uger ultimo Q3 2027 på begge matrikler

* Anslåede styringspunkter.

Beregnet potentiale i indsatserne

Planen hviler ikke på ét enkelt tiltag

Mere kapacitet nu

Pukkelafvikling
Udlægningsaftale
Kapacitet på tværs

* 685-1.320 patienter

Bedre drift

Booking og planlægning
Kvikservice
Arbejdsgange

* 35-60 patienter

Personale og kultur

Rekruttering
Alternative medarbejdere
Stabilitet

* 240-285 patienter

Teknologi

3D-print
REM
Nye arbejds gange


* 10-25 patienter

* Ca. 1.065 patienter skal behandles frem mod Q3 2027

* Samlet beregnet potentiale: 1.035-1.820 patienter

** Beregnet potentiale*

Udvikling i venteliste og ventetid, NOH

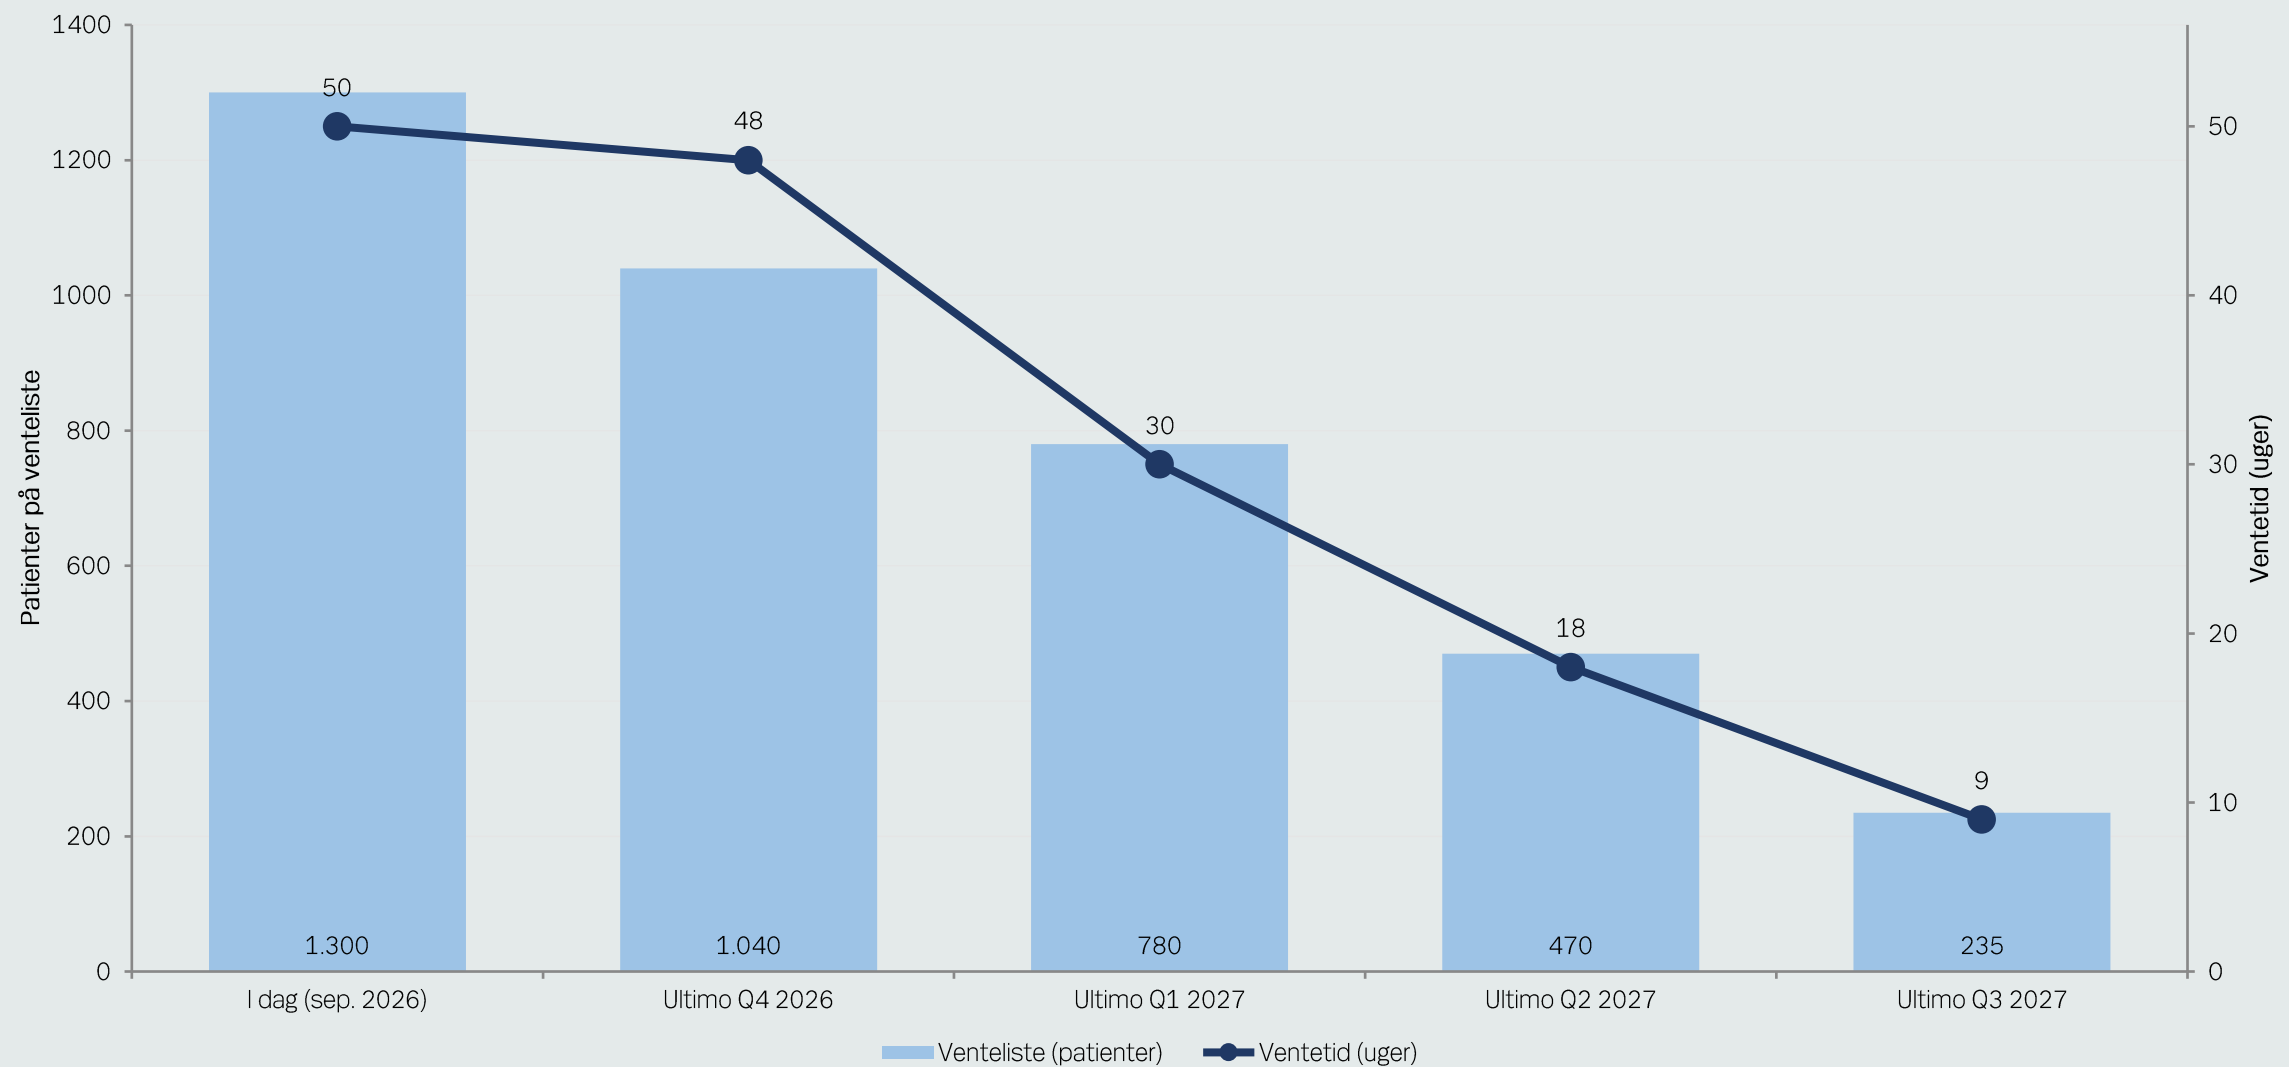

Noter:
BBH Audiologi forventes fortsat også at nå målet om 9 ugers ventetid pr. ultimo Q3 2027.
Eventuelle effekter sfa. dannelsen af Region Øst er ikke indregnet.
Potentiel stigning i henvisninger sfa. demografisk pres er ikke indregnet.
Effektiviseringer og tiltag sker under antagelse af stabilt henvisningsmønster samt de nuværende fysiske rammer.

Vi følger planen tæt og tilpasser løbende

Månedlig opfølgning gør det muligt at se tidligt, hvad der virker, og hvor vi skal justere

Det følger vi hver måned

- Ventetid og venteliste
- Aktivitet
- Bemanding og kapacitet
- Effekt af de væsentligste indsatser



Ved afvigelser

- Vi vurderer årsagen
- Vi tilpasser indsatsen
- Vi afsøger nye handlemuligheder

Vi venter ikke til Q3 2027 med at finde ud af, om planen virker.

Vi følger både Hillerød og Bispebjerg op mod de aftalte milepæle.
