


**SUNDHEDS
PLATFORMEN**

SP Porteføljestatusrapport SP FU

Februar , 2018

Porteføljesumé Februar 2018

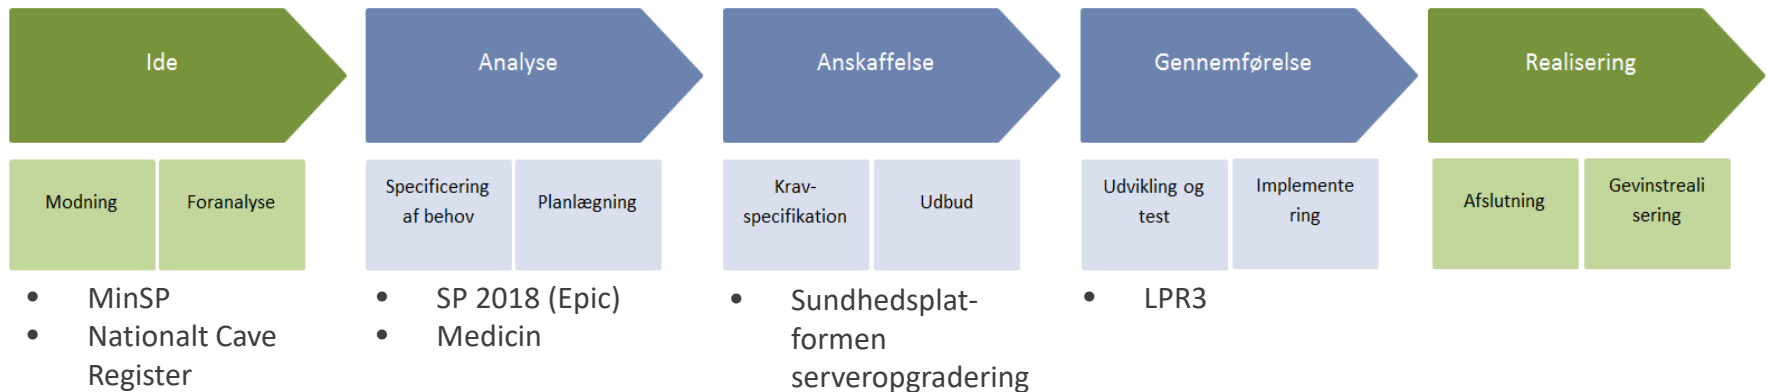

Kort beskrivelse	▲ Projekt fase	Projekt status	Tidsplan	Omkostninger	Scope	Ressource	Risici
Sundhedsplatformen serveropgradering	Anskaffelse (ny CIMT projektmodel)	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
SP 2018 opgradering	Analyse (ny CIMT projektmodel)	Grøn					
SP Medicinering	Analyse (ny CIMT projektmodel)	Grøn					
LPR3 implementering i RegSj og RegH	Gennemførelse (ny CIMT projektmodel)	Gul	Gul	Grøn	Grøn	Grøn	Gul

Der afrapporteres endnu ikke på projekter i Idéfasen. For projekter i analysefase rapporteres om projektet forventer at få godkendt projektinitieringsdokument.

Overordnet status på projekter – Feb 2018:

LPR 3.: Rapporterer i gul . Projektinitieringsdokument blev godkendt på SP Forretningsudvalget den 21. februar 2018. Der er en mindre afvigelse i tidsplanen for integrationsanalysen, da der er fundet en udfordring ift radiologi, hvor krav fra Sundhedsdatastyrelsen nødvendiggør dokumentation af 'behandlingsstart.' Afhængig af hvor stor den ændring bliver, kan det medføre en forsinkelse i færdiggørelse af en integrationsanalyse for radiologidelen. Analysen af denne udfordring er igangsat. Der bliver potentielt behov for eskalering til gruppen af faglige eksperter for radiologi området mhp. beslutning om ændringer i arbejdsgange, men projektet regner fortsat med at holde tidsplanen for den 3.november 2018. Projektet har den varslede strejke og lockout som væsentlig risici. Lockout vil påvirke tidsplanen for byg og test (afhængig af varighed)

Serveropgradering: Rapporterer i grøn. Projektinitieringsdokument blev godkendt på SP Forretningsudvalget den 21. februar 2018. Der er ikke kritiske fejl på nuværende tidspunkt og der holdes en meget tæt løbende dialog med Epic, således at alle planer bliver overholdt.

SP2018 : Rapporterer i grøn idet programmet følger planlagte proces for godkendelse af Projektinitieringsdokument, som blev godkendt på Sundhedsplatformens Forretningsudvalg den 19. marts 2018.

Medicinering: Rapporterer i grøn. Projektinitieringsdokument er under udarbejdelse og behandles på SP forretningsudvalg 23. april 2018.
