

Udskydelse af LPR3

Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen

KL

Torsdag d. 9. august 2018

Vurdering af mulige scenarier for SP18 tidsplan

Fredag den 6. juli, blev det aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at overgangen til LPR3 udskydes op til fire måneder.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har skullet beslutte, om SP18 opgraderingen af Sundhedsplatformen skal ske med ibrugtagning den 3. november (dvs. baseret på LPR2) fulgt af en anden ibrugtagning 1. marts (LPR3), eller om der skal foretages en samlet opgradering (SP18 baseret på LPR3) primo februar 2019.

Scenarie **Samlet Go-live**

Ibrugtagning på begge opgraderinger fastholdes til at ske samtidig.

Scenarie **Split Go-live**


Den oprindelige dato for opgraderingen af SP2018 fastholdes til ibrugtagning den 3. november 2018, mens ibrugtagning af LPR3 skydes til den 1. marts 2019.

Anbefaling

- Rammen for analysen har været at levere forbedringer til hospitalerne hurtigst muligt samtidig med at kvaliteten i opgraderingen fastholdes.
- Analysens overordnede resultater:
 - Begge scenarier er teknisk mulige
 - **Split** scenariet forudsætter en del dobbeltarbejde, men også dublering af testmiljøer til laboratorie- og røntgensystemer samt omskrivning af testcases. Dublering af testmiljøer vil tage 2-4 måneder.
 - **Split** scenariet medfører at byg af funktionalitet, test og uddannelse lapper over og at konsekvenserne kan betyde, at slutbrugeren undervises i noget forkert.
 - 2 omfattende implementeringer indenfor 4 måneder giver høj risiko for at SP18 og LPR3 ikke er tilstrækkeligt testet/fejlrrettet.
- Det anbefales derfor at vælge det **Samlet Go-live** scenarie med go-live primo februar, som vil medføre
 - ✓ Højere kvalitet af byg og test
 - ✓ Bedre uddannelse
 - ✓ Mere funktionalitet inkluderes i opgraderingen
 - ✓ Derudover undersøges muligheden for at inkludere yderligere forbedringer i samarbejde med Epic og SP governance

Eksempler på yderligere forbedringer (som skal analyseres nærmere!)

- Yderligere speciale gennemgang
- Fejlrettelser af Smart Links
- Konfigurerbare medicinforbedringer
- Forbedring af InBasket
- Stuegangsnavigatorer
- Optimering af fødselsnotat
- Autoopkobling af apparatur på anæstesi

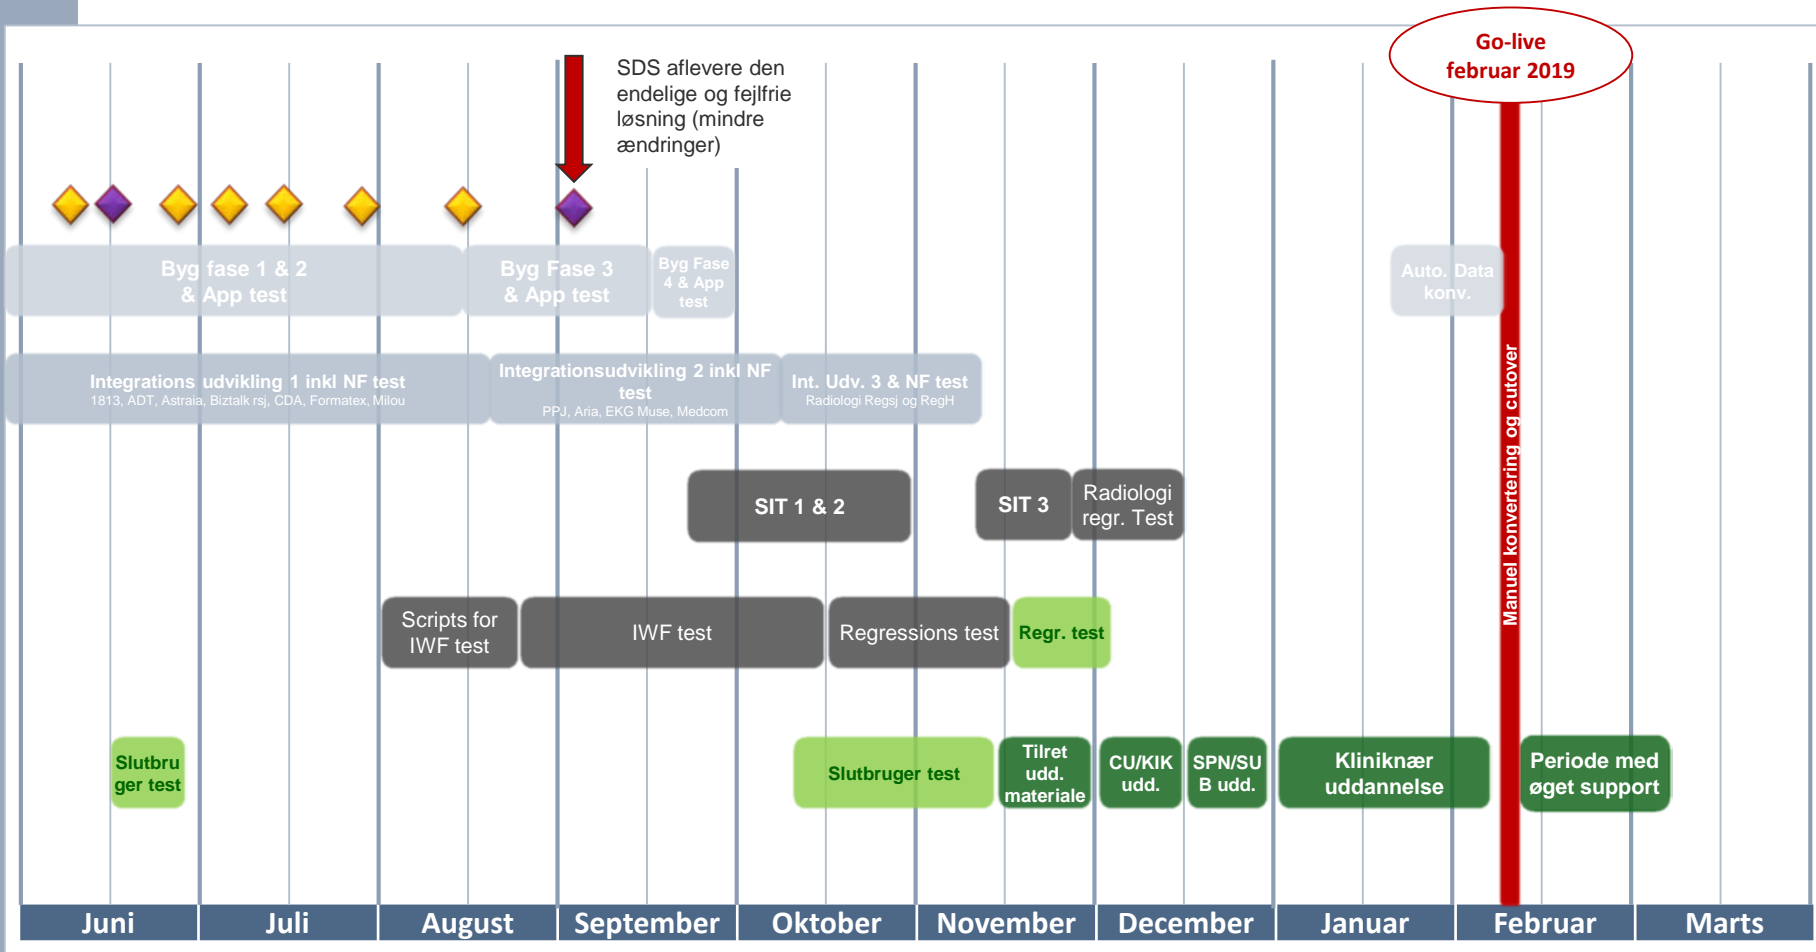

- ◆ Epic leverancer
- ◆ SDS leverancer

App: Applikationstest
SIT: System integrationstest
NF: Normal flow test
IWF: Integrated workflow test

